| Nom | Travail |
|---|---|
| **Compilateur Hello World** | **8j** |
| **Etape A: Analyse lexicale et syntaxique** | **4j** |
| Lexeur | 1j |
| Parseur | 1j |
| Tests unitaires associés | 2j |
| **Etape B: Analyse contextuelle** | **2j** |
| Implémentation des règles contextuelles | 1j |
| Tests unitaires associés | 1j |
| **Etape C: Génération du code** | **2j** |
| Génération du code | 1j |
| Tests unitaires associés | 1j |
| **Compilateur sans objet** | **28j** |
| **Etape A** | **4j** |
| Complétion du lexeur | 1j |
| Complétion du parser | 1j |
| Tests unitaires associés | 2j |
| **Etape B** | **6j** |
| Complétions des règles contextuelles | 4j |
| Tests unitaires associés | 2j |
| **Etape C** | **18j** |
| Génération du code | 10j |
| Tests unitaires associés | 8j |
| **Compilateur essentiel** | **31j** |
| **Etape A** | **7j** |
| Complétion du lexeur | 1j |
| Complétion du parser | 3j |
| Tests unitaires associés | 3j |
| **Etape B** | **9j** |
| Complétion des règles contextuelles | 6j |
| Tests unitaires associés | 3j |
| **Etape C** | **15j** |
| Génération du code | 10j |
| Tests unitaires associés | 5j |
| Rendu version intermédiaire | |
| **Extension** | **28j** |
| Specs | 4j |
| Code | 12j |
| Documentation | 12j |
| **Documentation** | **34j** |
| Manuel utilisateur (20/01 avant 20h) | 2j |
| Conception (24/01) | 6j |
| Validation (24/01) | 6j |
| Extension (24/01 avant 17h) | 10j |
| Impact énergétique (24/01) | 6j |
| Bilan gestion de projet (22/1 avant 9h) | 4j |
| Rendu Final avant 16h | |
| Soutenance à 10h45 | |

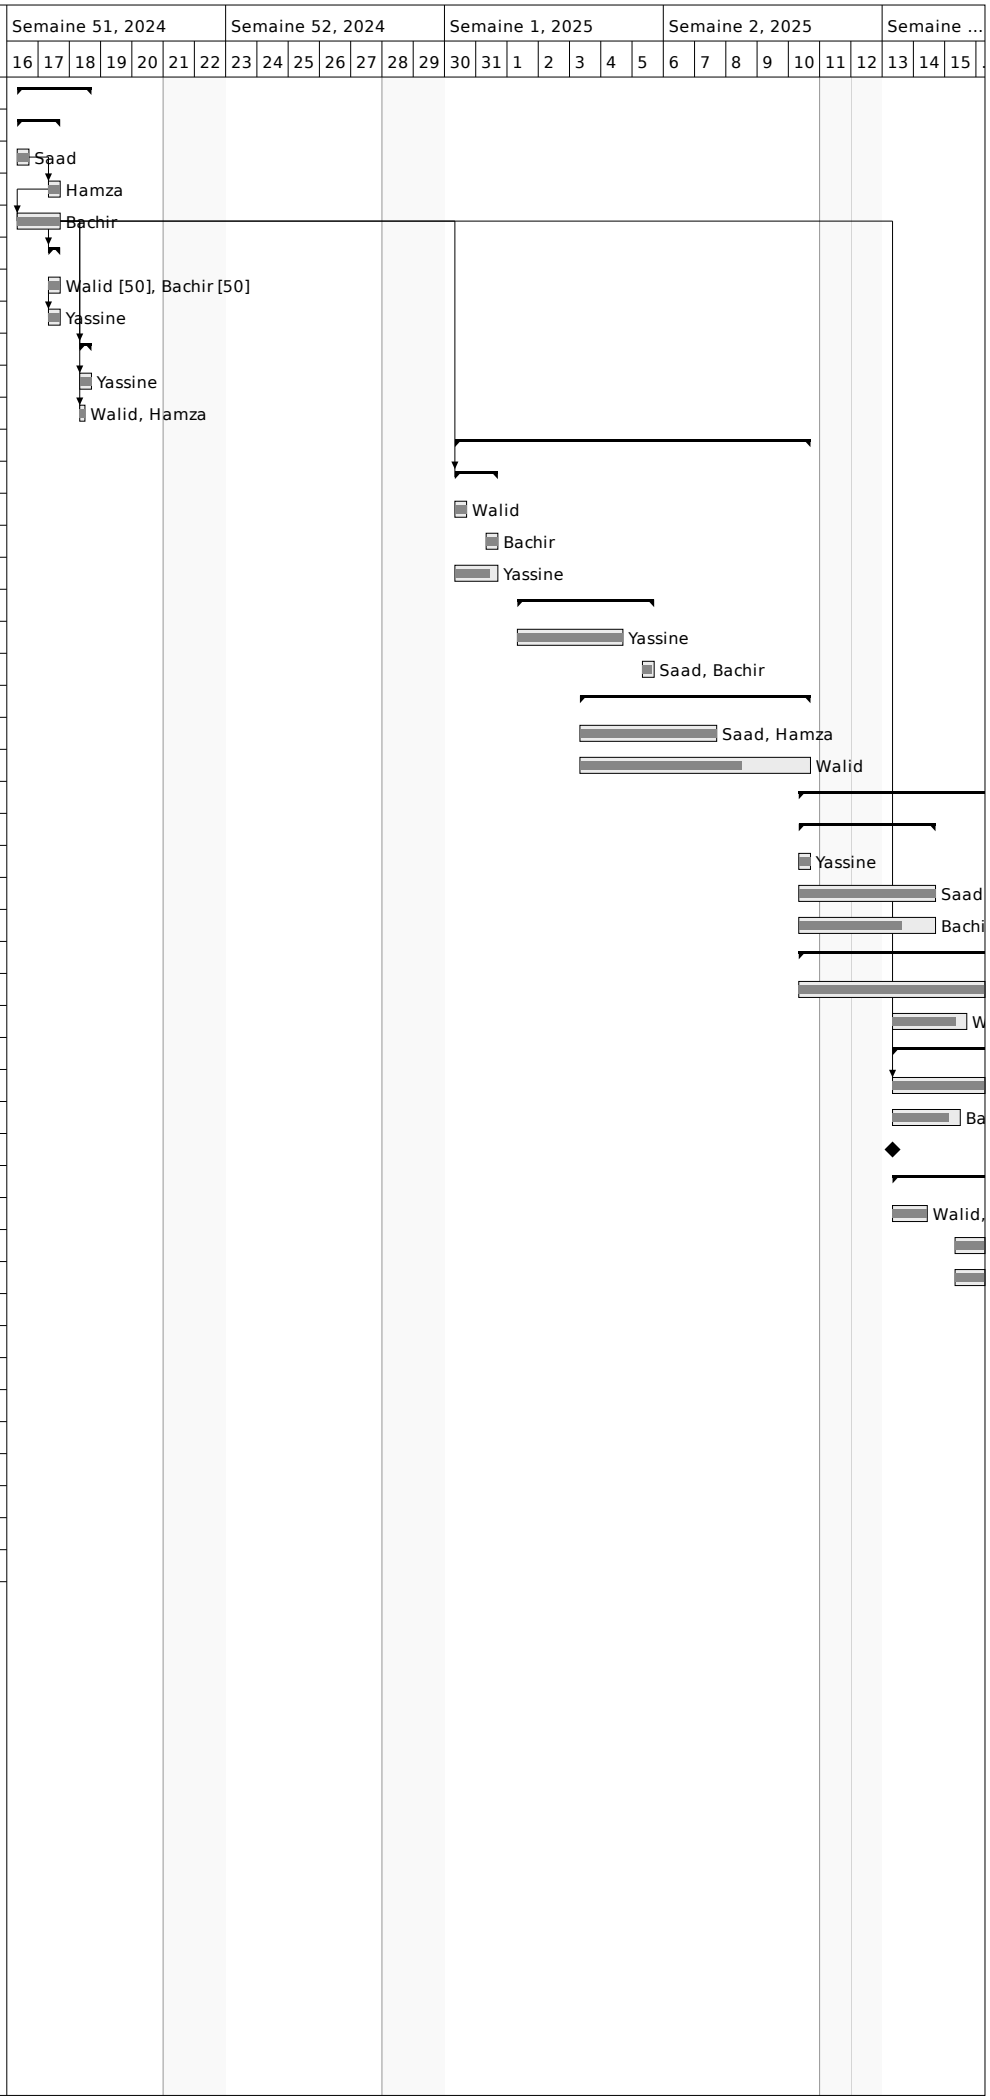

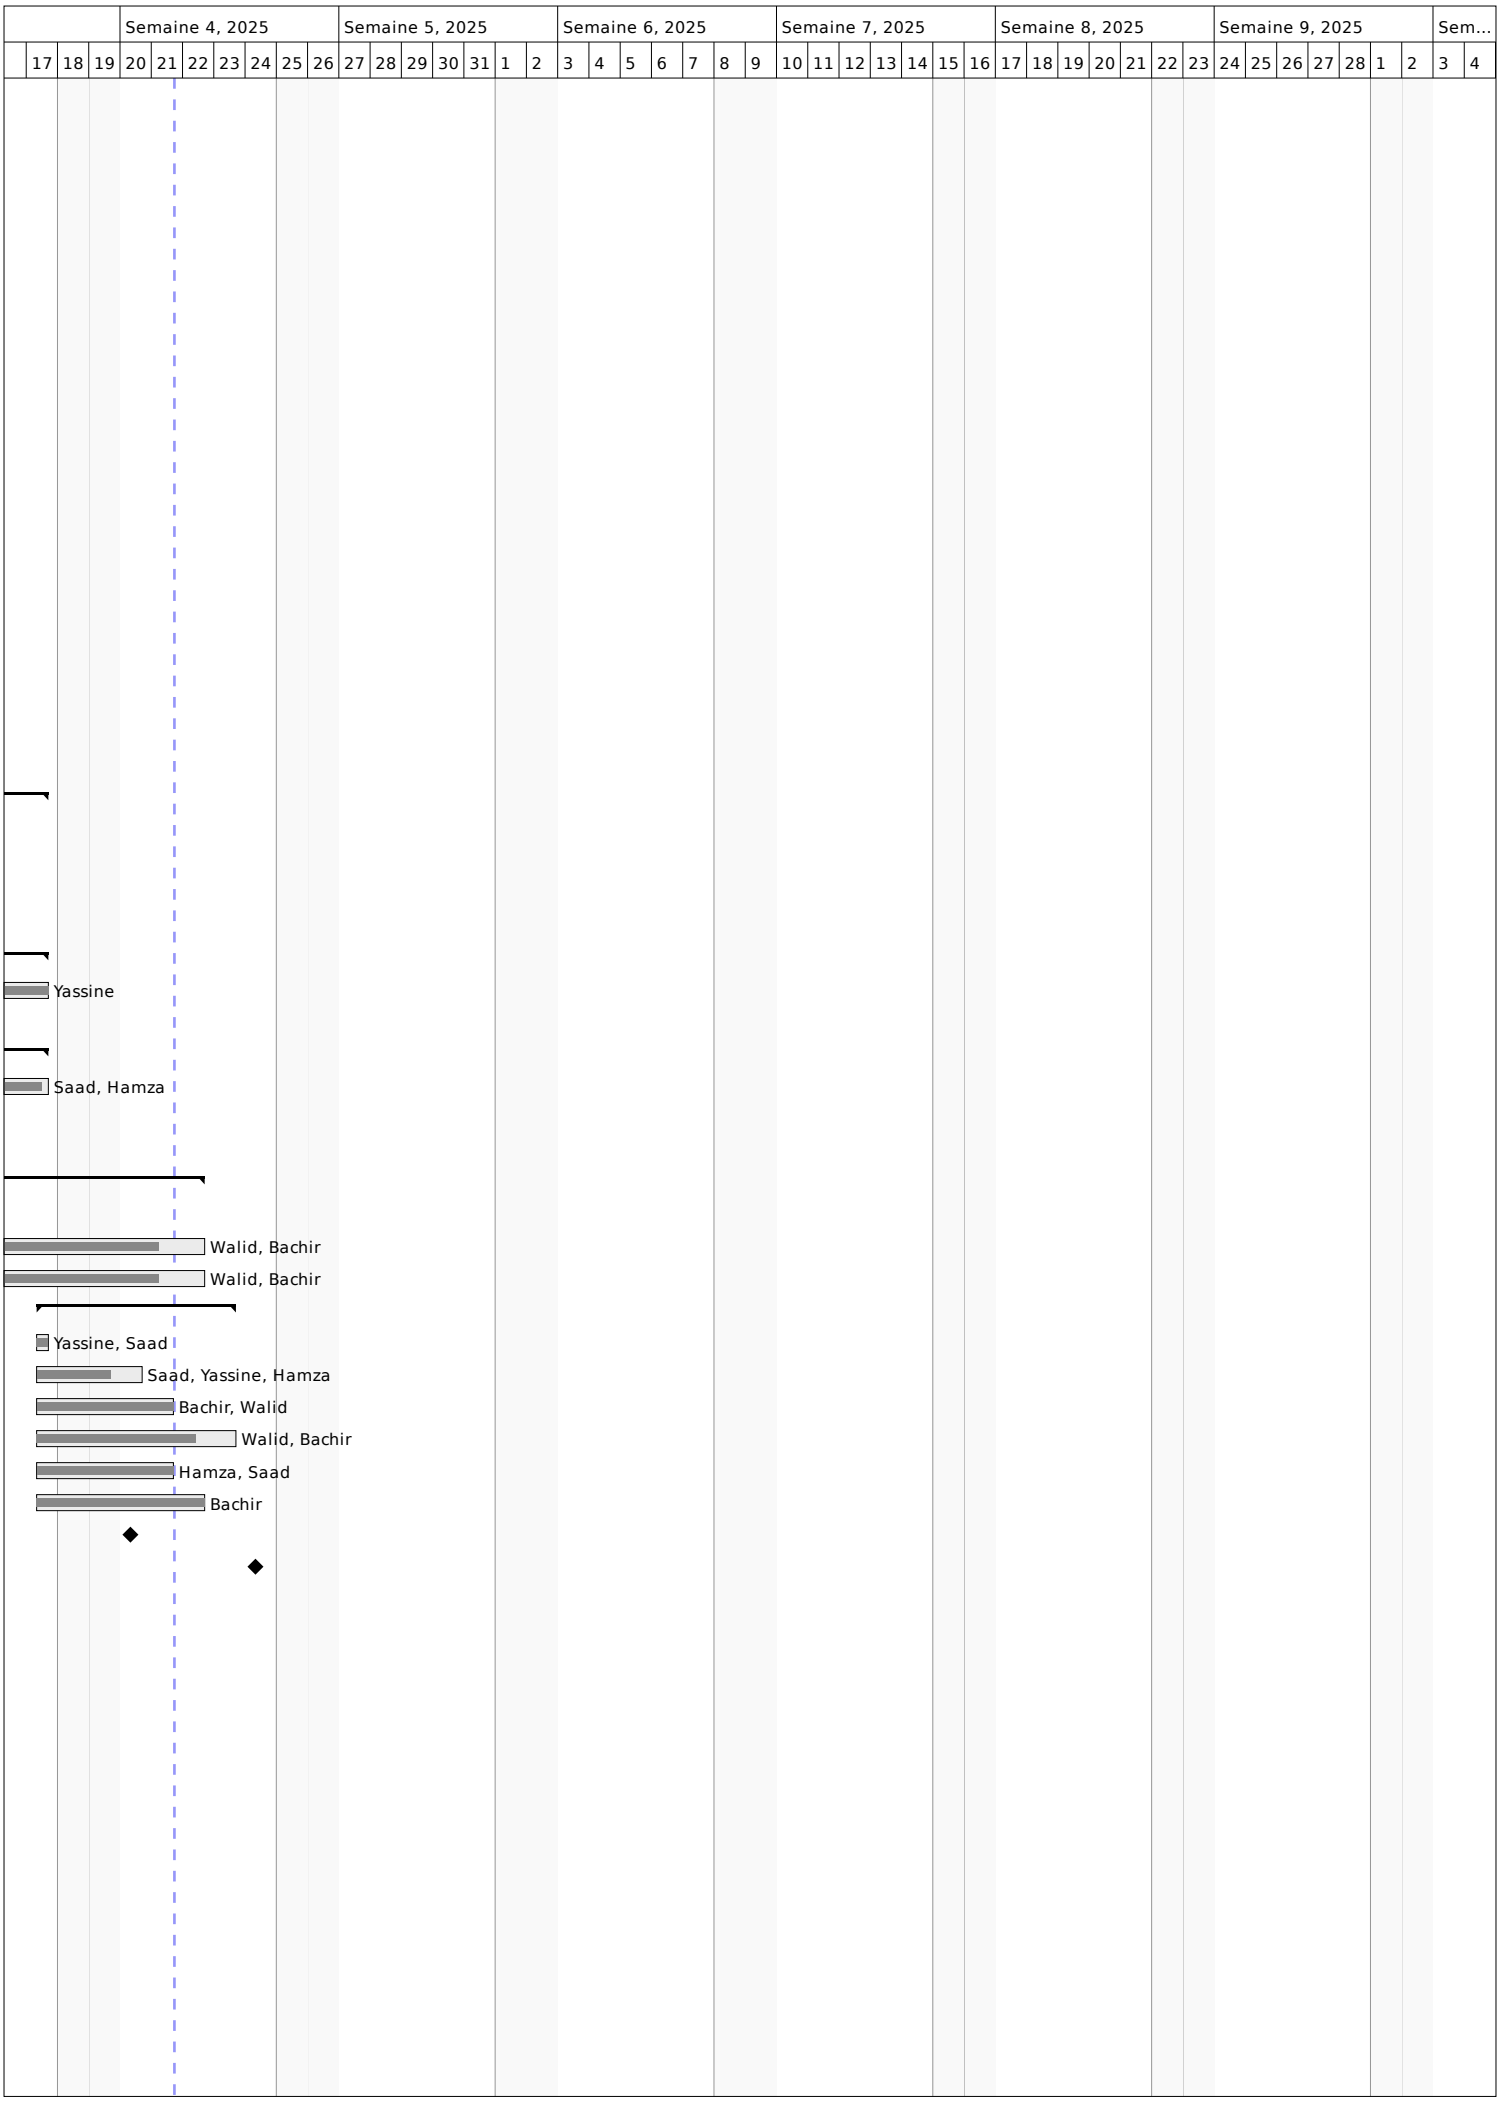
Semaine 4, 2025
Semaine 5, 2025
Semaine 6, 2025
Semaine 7, 2025
Semaine 8, 2025
Semaine 9, 2025
Sem...
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4
Yassine
Saad, Hamza
Walid, Bachir
Walid, Bachir
Yassine, Saad
Saad, Yassine, Hamza
Bachir, Walid
Walid, Bachir
Hamza, Saad
Bachir

| TPÉ | Nom | Démarré | Terminé | Travail | Durée | Latitude | Coût | Assigné à | État d'avancement (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Compilateur Hello World** | **déc. 16** | **déc. 18** | **8j** | **3j** | **28j** | **0** | | 100 |
| 1.1 | **Etape A: Analyse lexicale et syntaxique** | **déc. 16** | **déc. 17** | **4j** | **2j** | **29j** | **0** | | 100 |
| 1.1.1 | Lexeur | déc. 16 | déc. 16 | 1j | 1j | 24j | 0 | Saad | 100 |
| 1.1.2 | Parseur | déc. 17 | déc. 17 | 1j | 1j | 23j 5h | 0 | Hamza | 100 |
| 1.1.3 | Tests unitaires associés | déc. 16 | déc. 17 | 2j | 2j | 25j | 0 | Bachir | 100 |
| 1.2 | **Etape B: Analyse contextuelle** | **déc. 17** | **déc. 17** | **2j** | **1j** | **29j** | **0** | | 100 |
| 1.2.1 | Implémentation des règles contextuelles | déc. 17 | déc. 17 | 1j | 1j | 28j | 0 | Walid, Bachir | 100 |
| 1.2.2 | Tests unitaires associés | déc. 17 | déc. 17 | 1j | 1j | 29j | 0 | Yassine | 100 |
| 1.3 | **Etape C: Génération du code** | **déc. 18** | **déc. 18** | **2j** | **1j** | **28j** | **0** | | 100 |
| 1.3.1 | Génération du code | déc. 18 | déc. 18 | 1j | 1j | 27j 4h | 0 | Yassine | 100 |
| 1.3.2 | Tests unitaires associés | déc. 18 | déc. 18 | 1j | 4h | 28j 4h | 0 | Walid, Hamza | 100 |
| 2 | **Compilateur sans objet** | **déc. 30** | **janv. 10** | **28j** | **12j** | **9j** | **0** | | 85 |
| 2.1 | **Etape A** | **déc. 30** | **déc. 31** | **4j** | **2j** | **19j** | **0** | | 90 |
| 2.1.1 | Complétion du lexeur | déc. 30 | déc. 30 | 1j | 1j | 20j | 0 | Walid | 100 |
| 2.1.2 | Complétion du parser | déc. 31 | déc. 31 | 1j | 1j | 19j | 0 | Bachir | 100 |
| 2.1.3 | Tests unitaires associés | déc. 30 | déc. 31 | 2j | 2j | 19j | 0 | Yassine | 80 |
| 2.2 | **Etape B** | **janv. 1** | **janv. 5** | **6j** | **5j** | **14j** | **0** | | 90 |
| 2.2.1 | Complétions des règles contextuelles | janv. 1 | janv. 4 | 4j | 4j | 15j | 0 | Yassine | 100 |
| 2.2.2 | Tests unitaires associés | janv. 5 | janv. 5 | 2j | 1j | 14j | 0 | Saad, Bachir | 80 |
| 2.3 | **Etape C** | **janv. 3** | **janv. 10** | **18j** | **8j** | **9j** | **0** | | 80 |
| 2.3.1 | Génération du code | janv. 3 | janv. 7 | 10j | 5j | 12j | 0 | Saad, Hamza | 100 |
| 2.3.2 | Tests unitaires associés | janv. 3 | janv. 10 | 8j | 8j | 9j | 0 | Walid | 70 |
| 3 | **Compilateur essentiel** | **janv. 10** | **janv. 17** | **31j** | **6j** | **4j** | **0** | | 85 |
| 3.1 | **Etape A** | **janv. 10** | **janv. 14** | **7j** | **3j** | **7j** | **0** | | 80 |
| 3.1.1 | Complétion du lexeur | janv. 10 | janv. 10 | 1j | 1j | 9j | 0 | Yassine | 100 |
| 3.1.2 | Complétion du parser | janv. 10 | janv. 14 | 3j | 3j | 7j | 0 | Saad | 100 |
| 3.1.3 | Tests unitaires associés | janv. 10 | janv. 14 | 3j | 3j | 7j | 0 | Bachir | 75 |
| 3.2 | **Etape B** | **janv. 10** | **janv. 17** | **9j** | **6j** | **4j** | **0** | | 90 |
| 3.2.1 | Complétion des règles contextuelles | janv. 10 | janv. 17 | 6j | 6j | 4j | 0 | Yassine | 100 |
| 3.2.2 | Tests unitaires associés | janv. 13 | janv. 15 | 3j | 3j | 6j | 0 | Walid | 86 |
| 3.3 | **Etape C** | **janv. 13** | **janv. 17** | **15j** | **5j** | **4j** | **0** | | 80 |
| 3.3.1 | Génération du code | janv. 13 | janv. 17 | 10j | 5j | 4j | 0 | Saad, Hamza | 95 |
| 3.3.2 | Tests unitaires associés | janv. 13 | janv. 15 | 5j | 2j 4h | 6j 4h | 0 | Walid, Bachir | 83 |
| 4 | Rendu version intermédiaire | janv. 13 | janv. 13 | N/D | N/D | 9j | 0 | | 100 |
| 5 | **Extension** | **janv. 13** | **janv. 22** | **28j** | **8j** | **1j** | **0** | | 90 |
| 5.1 | Specs | janv. 13 | janv. 14 | 4j | 1j 2h | 7j 5h | 0 | Walid, Bachir, Yassine | 100 |
| 5.2 | Code | janv. 15 | janv. 22 | 12j | 6j | 1j | 0 | Walid, Bachir | 80 |
| 5.3 | Documentation | janv. 15 | janv. 22 | 12j | 6j | 1j | 0 | Walid, Bachir | 80 |
| 6 | **Documentation** | **janv. 17** | **janv. 23** | **34j** | **5j** | | **0** | | 90 |
| 6.1 | Manuel utilisateur (20/01 avant 20h) | janv. 17 | janv. 17 | 2j | 1j | 4j | 0 | Saad, Yassine | 100 |
| 6.2 | Conception (24/01) | janv. 17 | janv. 20 | 6j | 2j | 3j | 0 | Saad, Yassine, Hamza | 70 |
| 6.3 | Validation (24/01) | janv. 17 | janv. 21 | 6j | 3j | 2j | 0 | Walid, Bachir | 100 |
| 6.4 | Extension (24/01 avant 17h) | janv. 17 | janv. 23 | 10j | 5j | | 0 | Walid, Bachir | 80 |
| 6.5 | Impact énergétique (24/01) | janv. 17 | janv. 21 | 6j | 3j | 2j | 0 | Saad, Hamza | 100 |
| 6.6 | Bilan gestion de projet (22/1 avant 9h) | janv. 17 | janv. 22 | 4j | 4j | 1j | 0 | Bachir | 100 |
| 7 | Rendu Final avant 16h | janv. 20 | janv. 20 | N/D | N/D | 4j | 0 | | 100 |
| 8 | Soutenance à 10h45 | janv. 24 | janv. 24 | N/D | N/D | | 0 | | 0 |

| Nom | Nom abrégé | Type | Groupe | Adresse électronique | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| BARKATOU Walid | Walid | Travail | | | 0 |
| BELALLAM Saad | Saad | Travail | | | 0 |
| BELQASMI Bachir | Bachir | Travail | | | 0 |
| OUAGGAS Yassine | Yassine | Travail | | | 0 |
| SANTOURA Hamza | Hamza | Travail | | | 0 |
