Nom	Travail
Compilateur Hello World	**8j**
Etape A: Analyse lexicale et syntaxique	**4j**
Lexeur	1j
Parseur	1j
Tests unitaires associés	2j
Etape B: Analyse contextuelle	**2j**
Implémentation des règles contextuelles	1j
Tests unitaires associés	1j
Etape C: Génération du code	**2j**
Génération du code	1j
Tests unitaires associés	1j
Compilateur sans objet	**10j**
Etape A	**4j**
Complétion du lexeur	1j
Complétion du parser	1j
Tests unitaires associés	2j
Etape B	**2j**
Complétions des règles contextuelles	1j
Tests unitaires associés	1j
Etape C	**4j**
Génération du code	2j
Tests unitaires associés	2j
Compilateur essentiel	**21j**
Etape A	**7j**
Complétion du lexeur	1j
Complétion du parser	3j
Tests unitaires associés	3j
Etape B	**6j**
Complétion des règles contextuelles	3j
Tests unitaires associés	3j
Etape C	**8j**
Génération du code	4j
Tests unitaires associés	4j
Rendu version intermédiaire	
Rendu Final	
Rendu Bilan	
Rendu Documentation	
Soutenance	

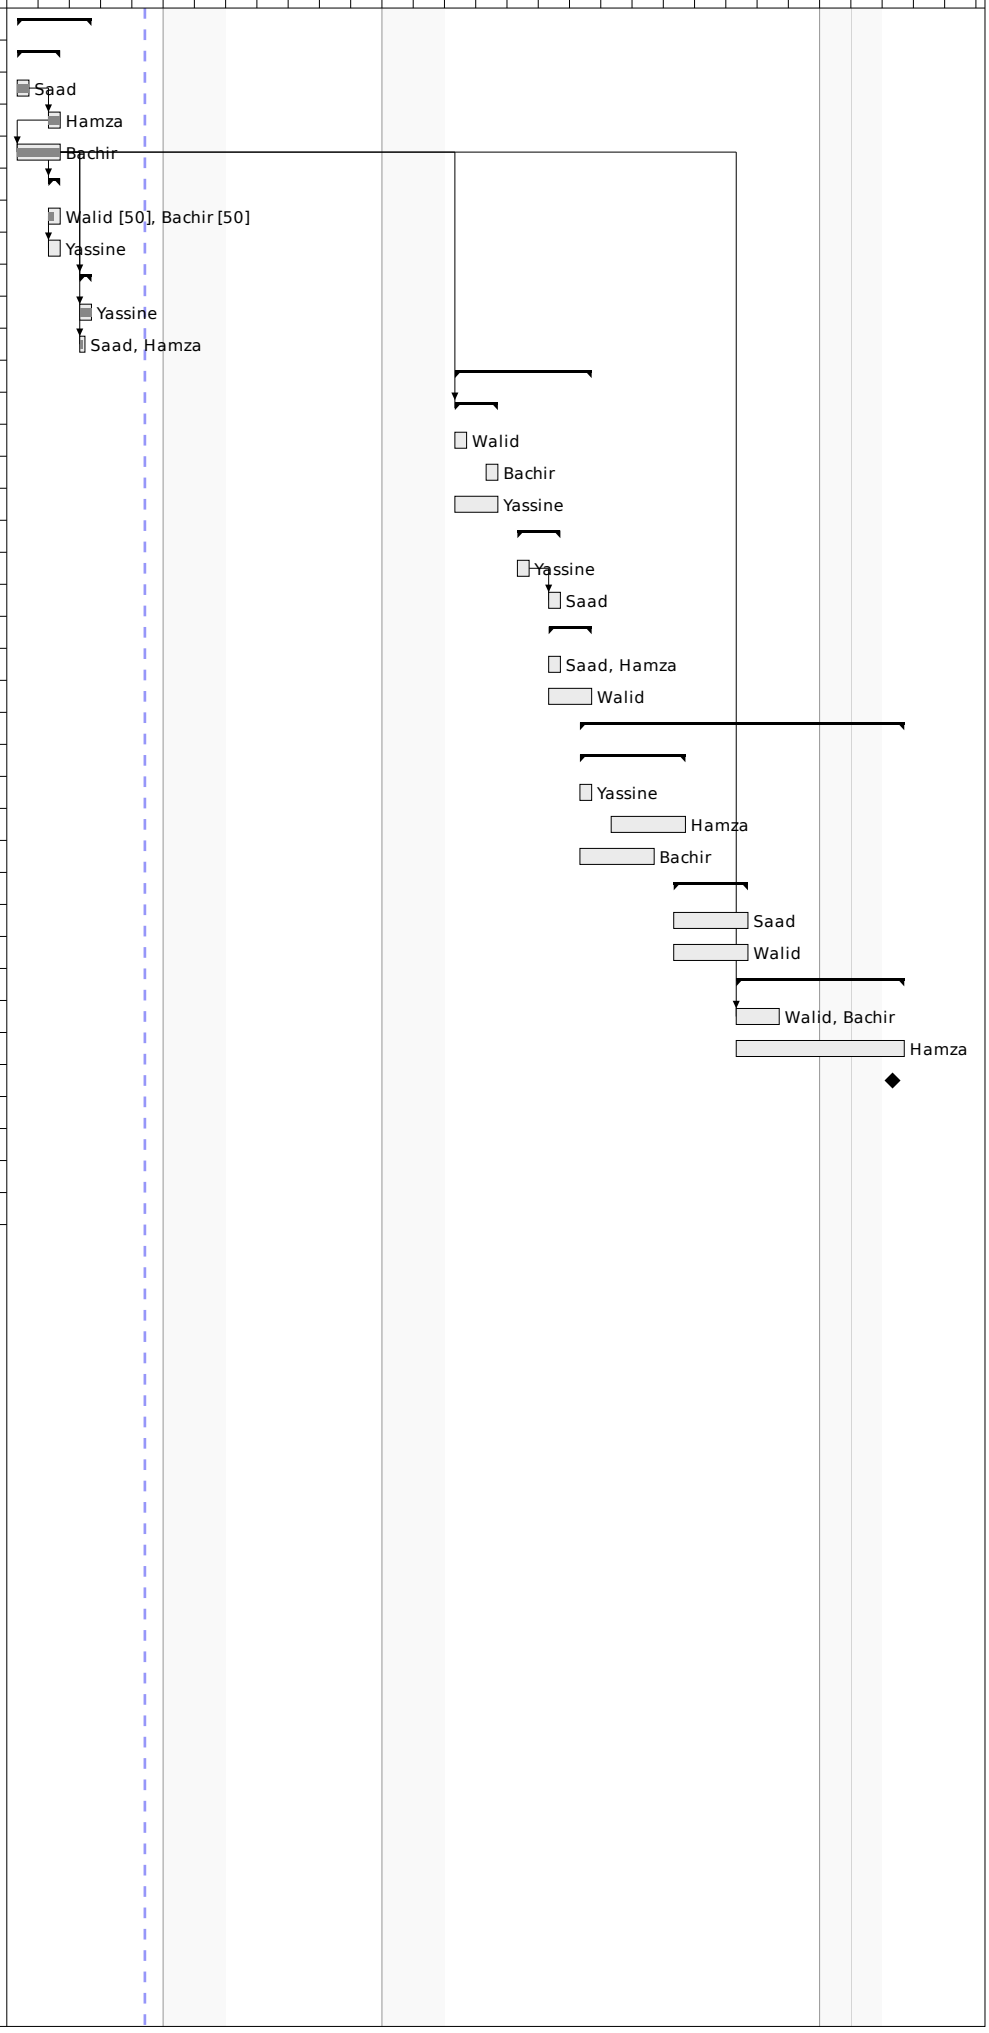

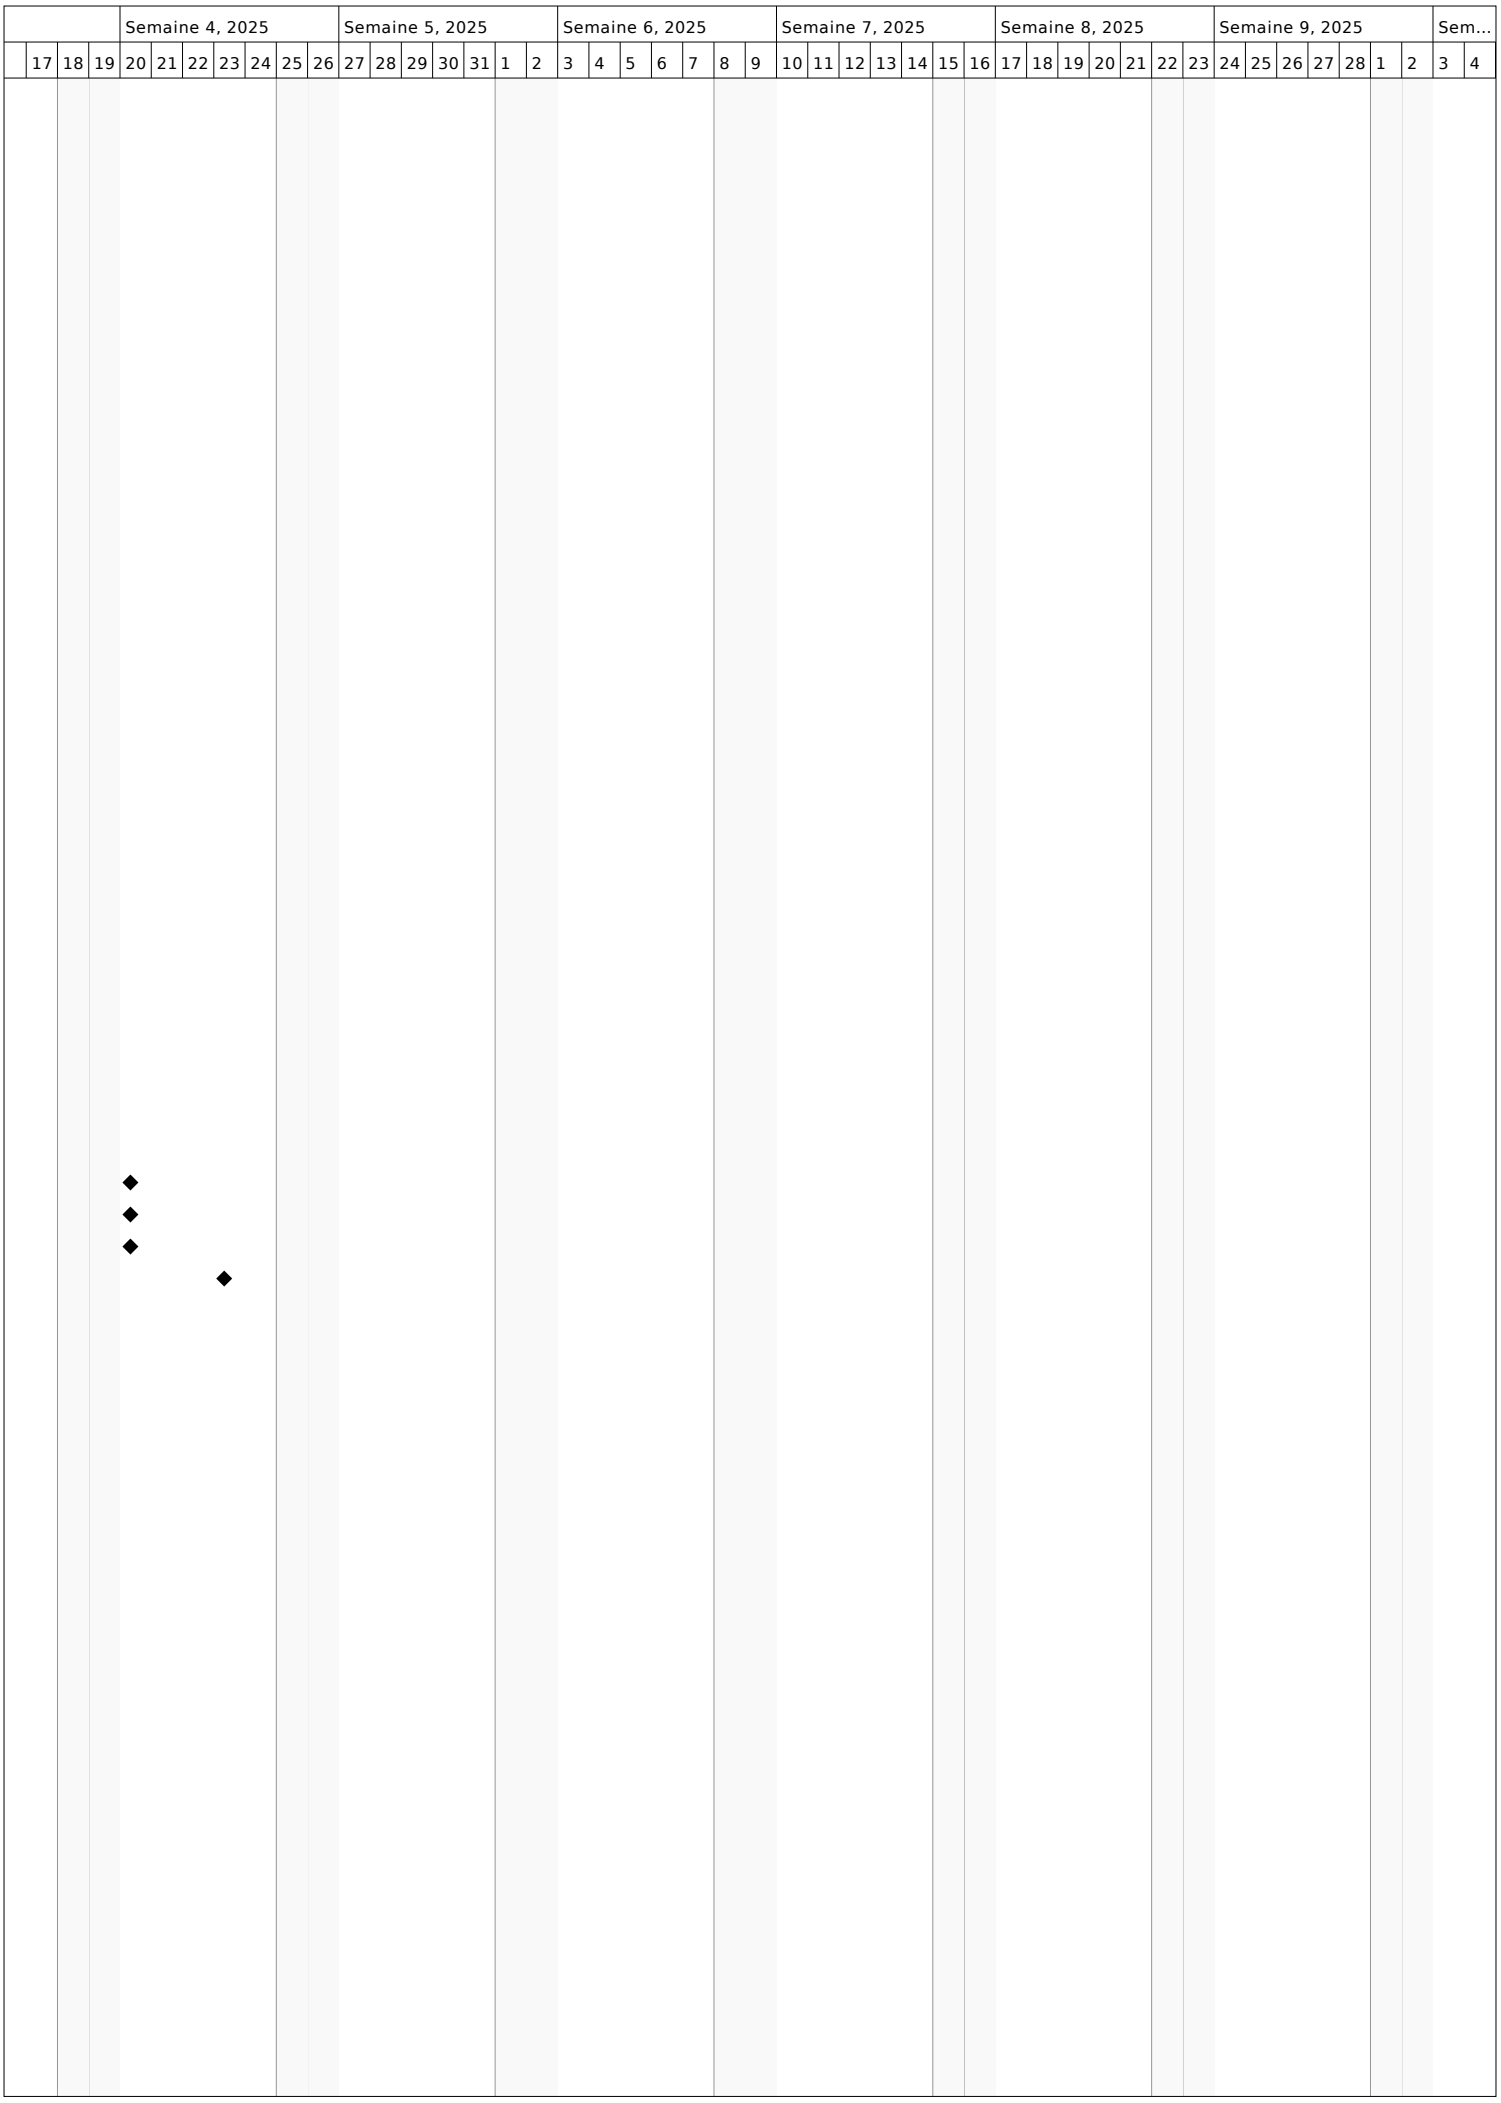
Semaine 4, 2025
Semaine 5, 2025
Semaine 6, 2025
Semaine 7, 2025
Semaine 8, 2025
Semaine 9, 2025
Sem...
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4

TPÉ	Nom	Démarré	Terminé	Travail	Durée	Latitude	Coût	Assigné à	État d'avancement (%)
1	**Compilateur Hello World**	**déc. 16**	**déc. 18**	**8j**	**3j**	**27j**	**0**		80
1.1	**Etape A: Analyse lexicale et syntaxique**	**déc. 16**	**déc. 17**	**4j**	**2j**	**28j**	**0**		100
1.1.1	Lexeur	déc. 16	déc. 16	1j	1j	26j	0	Saad	100
1.1.2	Parseur	déc. 17	déc. 17	1j	1j	25j	0	Hamza	100
1.1.3	Tests unitaires associés	déc. 16	déc. 17	2j	2j	26j	0	Bachir	100
1.2	**Etape B: Analyse contextuelle**	**déc. 17**	**déc. 17**	**2j**	**1j**	**28j**	**0**		0
1.2.1	Implémentation des règles contextuelles	déc. 17	déc. 17	1j	1j	27j	0	Walid, Bachir	50
1.2.2	Tests unitaires associés	déc. 17	déc. 17	1j	1j	28j	0	Yassine	0
1.3	**Etape C: Génération du code**	**déc. 18**	**déc. 18**	**2j**	**1j**	**27j**	**0**		75
1.3.1	Génération du code	déc. 18	déc. 18	1j	1j	26j 4h	0	Yassine	100
1.3.2	Tests unitaires associés	déc. 18	déc. 18	1j	4h	27j 4h	0	Saad, Hamza	50
2	**Compilateur sans objet**	**déc. 30**	**janv. 3**	**10j**	**5j**	**15j**	**0**		0
2.1	**Etape A**	**déc. 30**	**déc. 31**	**4j**	**2j**	**18j**	**0**		0
2.1.1	Complétion du lexeur	déc. 30	déc. 30	1j	1j	19j	0	Walid	0
2.1.2	Complétion du parser	déc. 31	déc. 31	1j	1j	18j	0	Bachir	0
2.1.3	Tests unitaires associés	déc. 30	déc. 31	2j	2j	18j	0	Yassine	0
2.2	**Etape B**	**janv. 1**	**janv. 2**	**2j**	**2j**	**16j**	**0**		0
2.2.1	Complétions des règles contextuelles	janv. 1	janv. 1	1j	1j	16j	0	Yassine	0
2.2.2	Tests unitaires associés	janv. 2	janv. 2	1j	1j	16j	0	Saad	0
2.3	**Etape C**	**janv. 2**	**janv. 3**	**4j**	**2j**	**15j**	**0**		0
2.3.1	Génération du code	janv. 2	janv. 2	2j	1j	16j	0	Saad, Hamza	0
2.3.2	Tests unitaires associés	janv. 2	janv. 3	2j	2j	15j	0	Walid	0
3	**Compilateur essentiel**	**janv. 3**	**janv. 13**	**21j**	**9j**	**7j**	**0**		0
3.1	**Etape A**	**janv. 3**	**janv. 6**	**7j**	**4j**	**12j**	**0**		0
3.1.1	Complétion du lexeur	janv. 3	janv. 3	1j	1j	15j	0	Yassine	0
3.1.2	Complétion du parser	janv. 4	janv. 6	3j	3j	12j	0	Hamza	0
3.1.3	Tests unitaires associés	janv. 3	janv. 5	3j	3j	13j	0	Bachir	0
3.2	**Etape B**	**janv. 6**	**janv. 8**	**6j**	**3j**	**10j**	**0**		0
3.2.1	Complétion des règles contextuelles	janv. 6	janv. 8	3j	3j	10j	0	Saad	0
3.2.2	Tests unitaires associés	janv. 6	janv. 8	3j	3j	10j	0	Walid	0
3.3	**Etape C**	**janv. 8**	**janv. 13**	**8j**	**4j**	**7j**	**0**		0
3.3.1	Génération du code	janv. 8	janv. 9	4j	2j	9j	0	Walid, Bachir	0
3.3.2	Tests unitaires associés	janv. 8	janv. 13	4j	4j	7j	0	Hamza	0
4	Rendu version intermédiaire	janv. 13	janv. 13	N/D	N/D	8j	0		0
5	Rendu Final	janv. 20	janv. 20	N/D	N/D	3j	0		0
6	Rendu Bilan	janv. 20	janv. 20	N/D	N/D	3j	0		0
7	Rendu Documentation	janv. 20	janv. 20	N/D	N/D	3j	0		0
8	Soutenance	janv. 23	janv. 23	N/D	N/D		0		0

Nom	Nom abrégé	Type	Groupe	Adresse électronique	Coût
BARKATOU Walid	Walid	Travail			0
BELALLAM Saad	Saad	Travail			0
BELQASMI Bachir	Bachir	Travail			0
OUAGGAS Yassine	Yassine	Travail			0
SANTOURA Hamza	Hamza	Travail			0
