Nom	Travail
Compilateur Hello World	**8j**
Etape A: Analyse lexicale et syntaxique	**4j**
Lexeur	1j
Parseur	1j
Tests unitaires associés	2j
Etape B: Analyse contextuelle	**2j**
Implémentation des règles contextuelles	1j
Tests unitaires associés	1j
Etape C: Génération du code	**2j**
Génération du code	1j
Tests unitaires associés	1j
Compilateur sans objet	**28j**
Etape A	**4j**
Complétion du lexeur	1j
Complétion du parser	1j
Tests unitaires associés	2j
Etape B	**6j**
Complétions des règles contextuelles	4j
Tests unitaires associés	2j
Etape C	**18j**
Génération du code	10j
Tests unitaires associés	8j
Compilateur essentiel	**31j**
Etape A	**7j**
Complétion du lexeur	1j
Complétion du parser	3j
Tests unitaires associés	3j
Etape B	**9j**
Complétion des règles contextuelles	6j
Tests unitaires associés	3j
Etape C	**15j**
Génération du code	10j
Tests unitaires associés	5j
Rendu version intermédiaire	
Extension	**20j**
Specs	4j
Code	8j
Documentation	8j
Documentation	**30j**
Manuel utilisateur	2j
Conception	6j
Validation	6j
Extension	6j
Impact énergétique	6j
Bilan gestion de projet	4j
Rendu Final	
Rendu Bilan	
Rendu Documentation	
Soutenance	

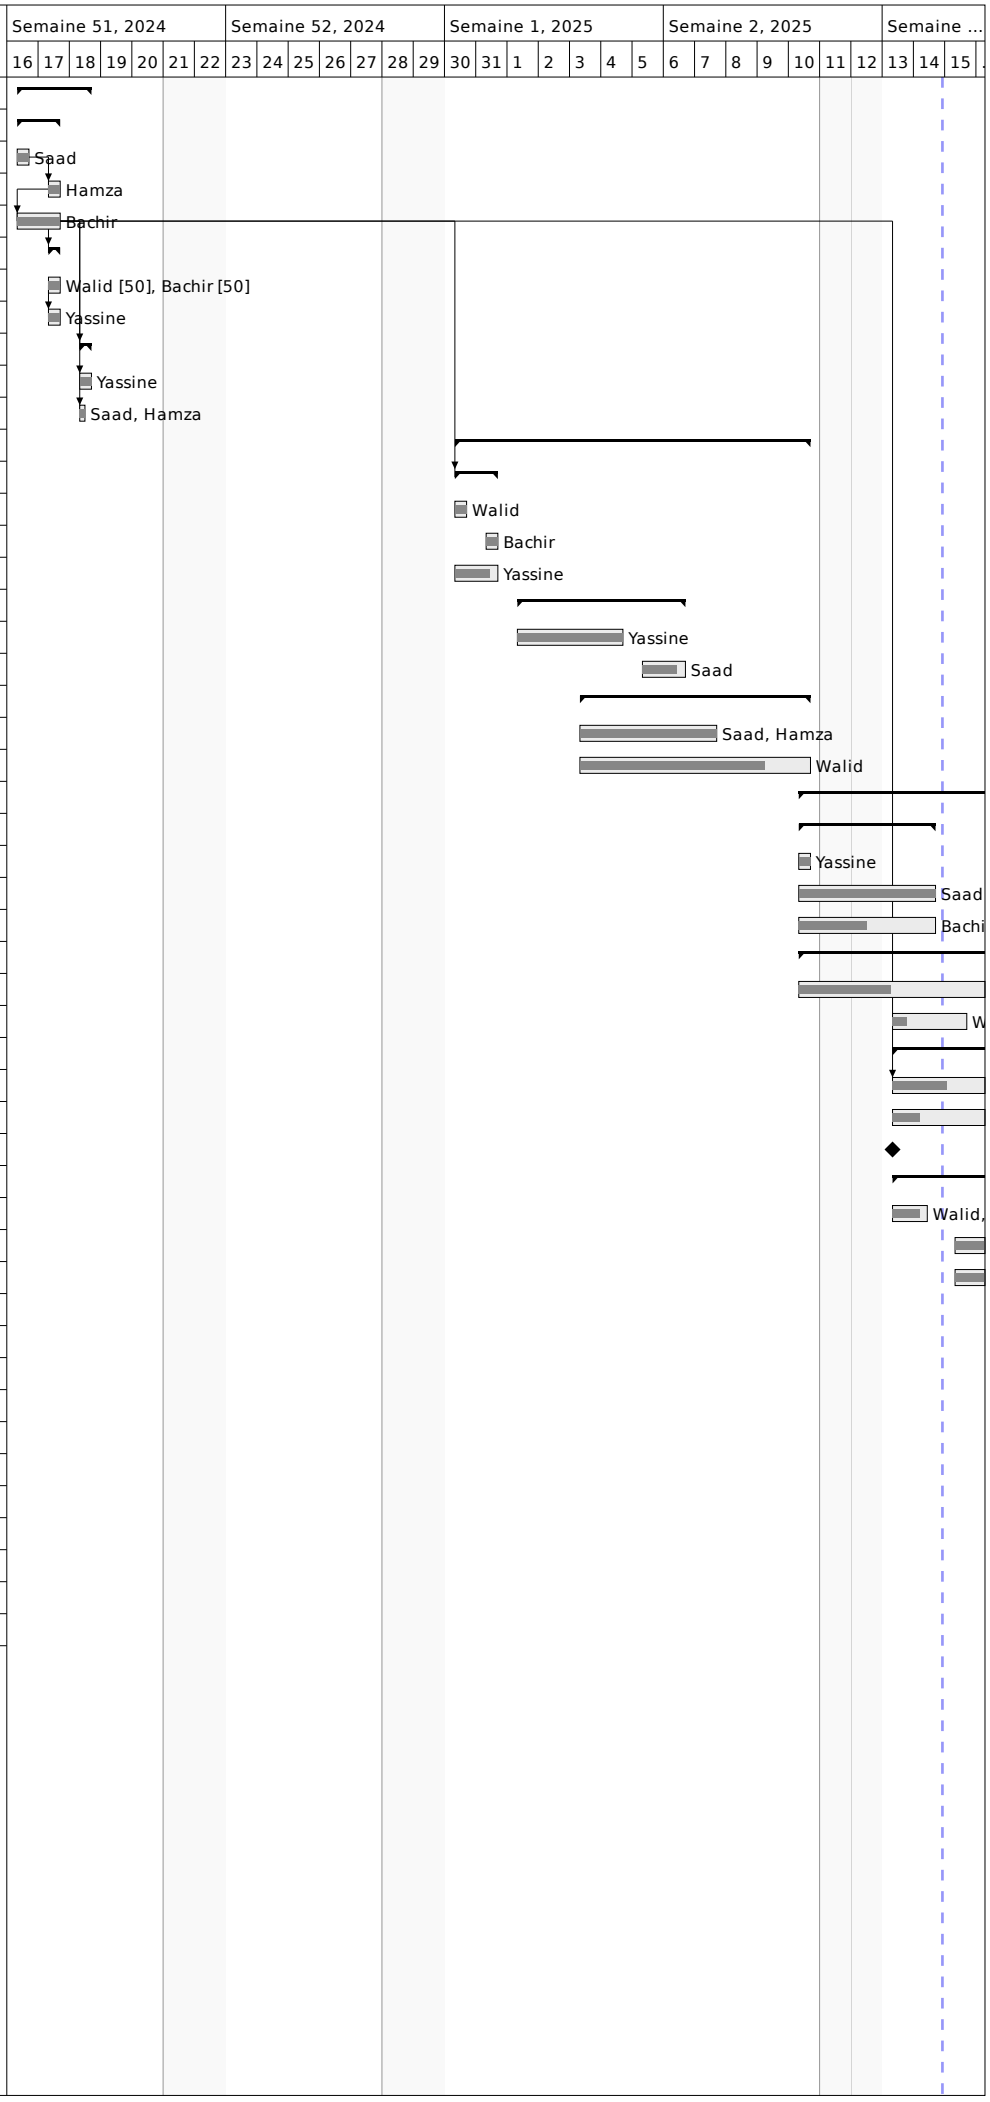

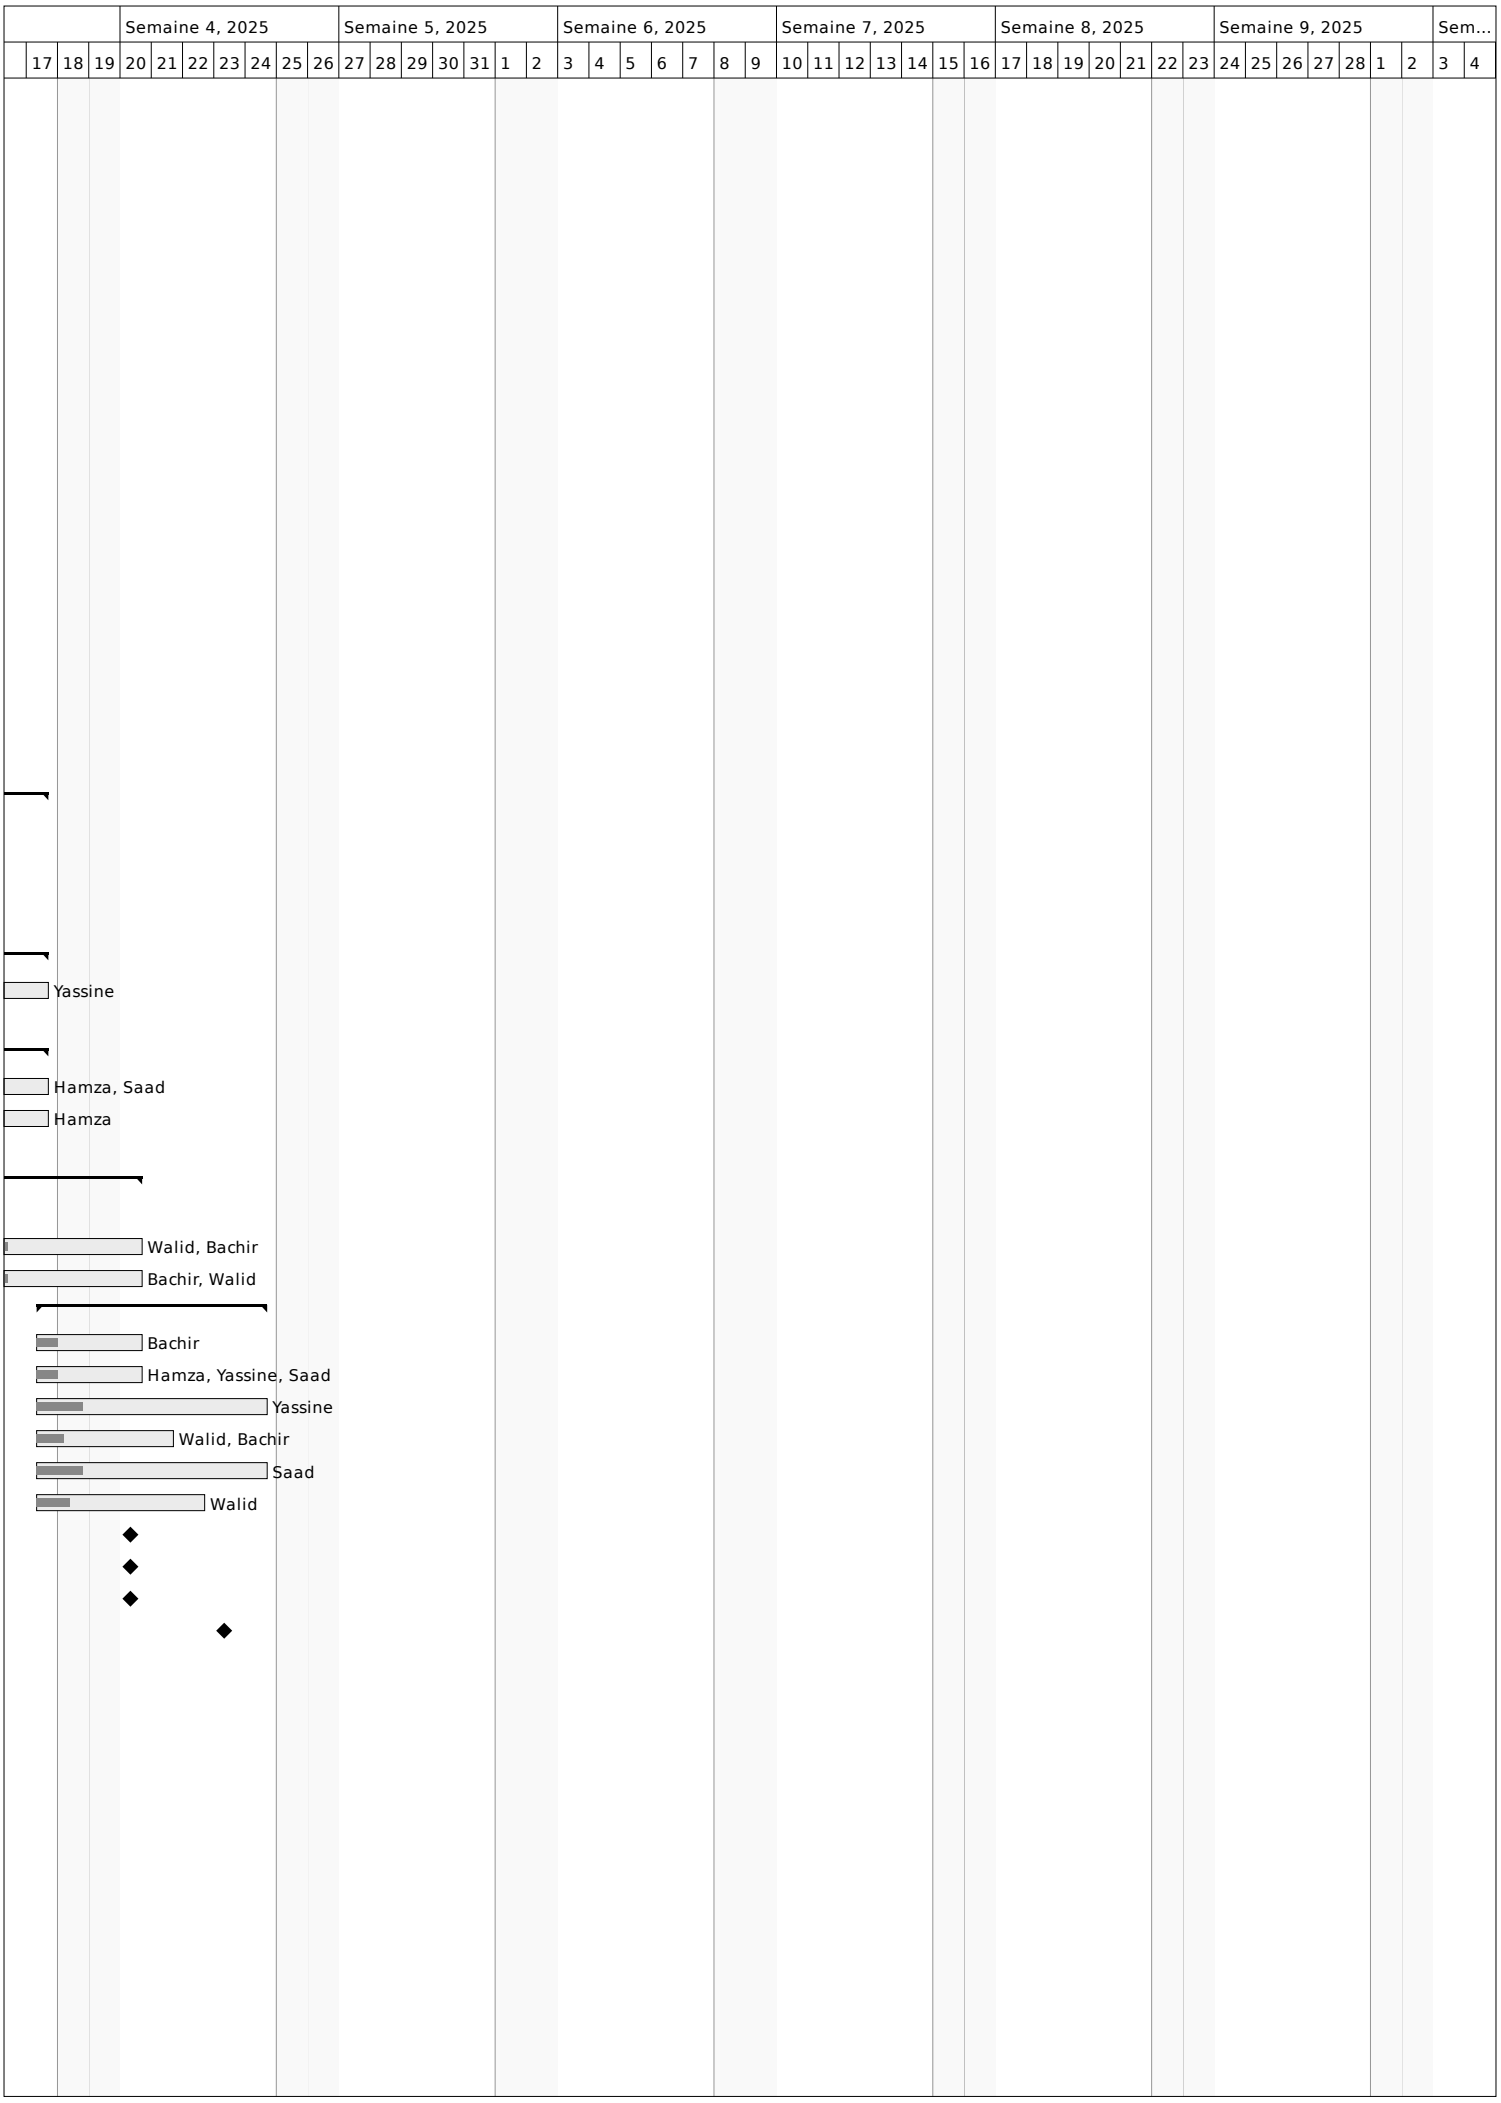
Semaine 4, 2025
Semaine 5, 2025
Semaine 6, 2025
Semaine 7, 2025
Semaine 8, 2025
Semaine 9, 2025
Sem...
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4
Yassine
Hamza, Saad
Hamza
Walid, Bachir
Bachir, Walid
Bachir
Hamza, Yassine, Saad
Yassine
Walid, Bachir
Saad
Walid

TPÉ	Nom	Démarré	Terminé	Travail	Durée	Latitude	Coût	Assigné à	État d'avancement (%)
1	**Compilateur Hello World**	**déc. 16**	**déc. 18**	**8j**	**3j**	**29j**	**0**		100
1.1	**Etape A: Analyse lexicale et syntaxique**	**déc. 16**	**déc. 17**	**4j**	**2j**	**30j**	**0**		100
1.1.1	Lexeur	déc. 16	déc. 16	1j	1j	24j 5h	0	Saad	100
1.1.2	Parseur	déc. 17	déc. 17	1j	1j	24j	0	Hamza	100
1.1.3	Tests unitaires associés	déc. 16	déc. 17	2j	2j	25j	0	Bachir	100
1.2	**Etape B: Analyse contextuelle**	**déc. 17**	**déc. 17**	**2j**	**1j**	**30j**	**0**		100
1.2.1	Implémentation des règles contextuelles	déc. 17	déc. 17	1j	1j	29j	0	Walid, Bachir	100
1.2.2	Tests unitaires associés	déc. 17	déc. 17	1j	1j	30j	0	Yassine	100
1.3	**Etape C: Génération du code**	**déc. 18**	**déc. 18**	**2j**	**1j**	**29j**	**0**		100
1.3.1	Génération du code	déc. 18	déc. 18	1j	1j	28j	0	Yassine	100
1.3.2	Tests unitaires associés	déc. 18	déc. 18	1j	4h	29j 4h	0	Saad, Hamza	100
2	**Compilateur sans objet**	**déc. 30**	**janv. 10**	**28j**	**12j**	**10j**	**0**		90
2.1	**Etape A**	**déc. 30**	**déc. 31**	**4j**	**2j**	**20j**	**0**		90
2.1.1	Complétion du lexeur	déc. 30	déc. 30	1j	1j	21j	0	Walid	100
2.1.2	Complétion du parser	déc. 31	déc. 31	1j	1j	20j	0	Bachir	100
2.1.3	Tests unitaires associés	déc. 30	déc. 31	2j	2j	20j	0	Yassine	80
2.2	**Etape B**	**janv. 1**	**janv. 6**	**6j**	**6j**	**14j**	**0**		90
2.2.1	Complétions des règles contextuelles	janv. 1	janv. 4	4j	4j	16j	0	Yassine	100
2.2.2	Tests unitaires associés	janv. 5	janv. 6	2j	2j	14j	0	Saad	80
2.3	**Etape C**	**janv. 3**	**janv. 10**	**18j**	**8j**	**10j**	**0**		90
2.3.1	Génération du code	janv. 3	janv. 7	10j	5j	13j	0	Saad, Hamza	100
2.3.2	Tests unitaires associés	janv. 3	janv. 10	8j	8j	10j	0	Walid	80
3	**Compilateur essentiel**	**janv. 10**	**janv. 17**	**31j**	**6j**	**5j**	**0**		30
3.1	**Etape A**	**janv. 10**	**janv. 14**	**7j**	**3j**	**8j**	**0**		80
3.1.1	Complétion du lexeur	janv. 10	janv. 10	1j	1j	10j	0	Yassine	100
3.1.2	Complétion du parser	janv. 10	janv. 14	3j	3j	8j	0	Saad	100
3.1.3	Tests unitaires associés	janv. 10	janv. 14	3j	3j	8j	0	Bachir	50
3.2	**Etape B**	**janv. 10**	**janv. 17**	**9j**	**6j**	**5j**	**0**		30
3.2.1	Complétion des règles contextuelles	janv. 10	janv. 17	6j	6j	5j	0	Yassine	40
3.2.2	Tests unitaires associés	janv. 13	janv. 15	3j	3j	7j	0	Walid	20
3.3	**Etape C**	**janv. 13**	**janv. 17**	**15j**	**5j**	**5j**	**0**		30
3.3.1	Génération du code	janv. 13	janv. 17	10j	5j	5j	0	Saad, Hamza	40
3.3.2	Tests unitaires associés	janv. 13	janv. 17	5j	5j	5j	0	Hamza	20
4	Rendu version intermédiaire	janv. 13	janv. 13	N/D	N/D	10j	0		100
5	**Extension**	**janv. 13**	**janv. 20**	**20j**	**6j**	**4j**	**0**		30
5.1	Specs	janv. 13	janv. 14	4j	1j 2h	8j 5h	0	Walid, Bachir, Yassine	80
5.2	Code	janv. 15	janv. 20	8j	4j	4j	0	Walid, Bachir	20
5.3	Documentation	janv. 15	janv. 20	8j	4j	4j	0	Walid, Bachir	20
6	**Documentation**	**janv. 17**	**janv. 24**	**30j**	**6j**		**0**		20
6.1	Manuel utilisateur	janv. 17	janv. 20	2j	2j	4j	0	Bachir	20
6.2	Conception	janv. 17	janv. 20	6j	2j	4j	0	Saad, Yassine, Hamza	20
6.3	Validation	janv. 17	janv. 24	6j	6j		0	Yassine	20
6.4	Extension	janv. 17	janv. 21	6j	3j	3j	0	Walid, Bachir	20
6.5	Impact énergétique	janv. 17	janv. 24	6j	6j		0	Saad	20
6.6	Bilan gestion de projet	janv. 17	janv. 22	4j	4j	2j	0	Walid	20
7	Rendu Final	janv. 20	janv. 20	N/D	N/D	5j	0		0
8	Rendu Bilan	janv. 20	janv. 20	N/D	N/D	5j	0		0
9	Rendu Documentation	janv. 20	janv. 20	N/D	N/D	5j	0		0
10	Soutenance	janv. 23	janv. 23	N/D	N/D	2j	0		0

Nom	Nom abrégé	Type	Groupe	Adresse électronique	Coût
BARKATOU Walid	Walid	Travail			0
BELALLAM Saad	Saad	Travail			0
BELQASMI Bachir	Bachir	Travail			0
OUAGGAS Yassine	Yassine	Travail			0
SANTOURA Hamza	Hamza	Travail			0
