Nom	Travail
Compilateur Hello World	**8j**
Etape A: Analyse lexicale et syntaxique	**4j**
Lexeur	1j
Parseur	1j
Tests unitaires associés	2j
Etape B: Analyse contextuelle	**2j**
Implémentation des règles contextuelles	1j
Tests unitaires associés	1j
Etape C: Génération du code	**2j**
Génération du code	1j
Tests unitaires associés	1j
Compilateur sans objet	**23j**
Etape A	**4j**
Complétion du lexeur	1j
Complétion du parser	1j
Tests unitaires associés	2j
Etape B	**6j**
Complétions des règles contextuelles	4j
Tests unitaires associés	2j
Etape C	**13j**
Génération du code	10j
Tests unitaires associés	3j
Compilateur essentiel	**29j**
Etape A	**7j**
Complétion du lexeur	1j
Complétion du parser	3j
Tests unitaires associés	3j
Etape B	**9j**
Complétion des règles contextuelles	6j
Tests unitaires associés	3j
Etape C	**13j**
Génération du code	10j
Tests unitaires associés	3j
Rendu version intermédiaire	
Extension	**22j**
Specs	4j
Code	10j
Documentation	8j
Documentation	**25j**
Manuel utilisateur	2j
Conception	6j
Validation	5j
Extension	6j
Impact énergétique	3j
Bilan gestion de projet	3j
Rendu Final	
Soutenance	

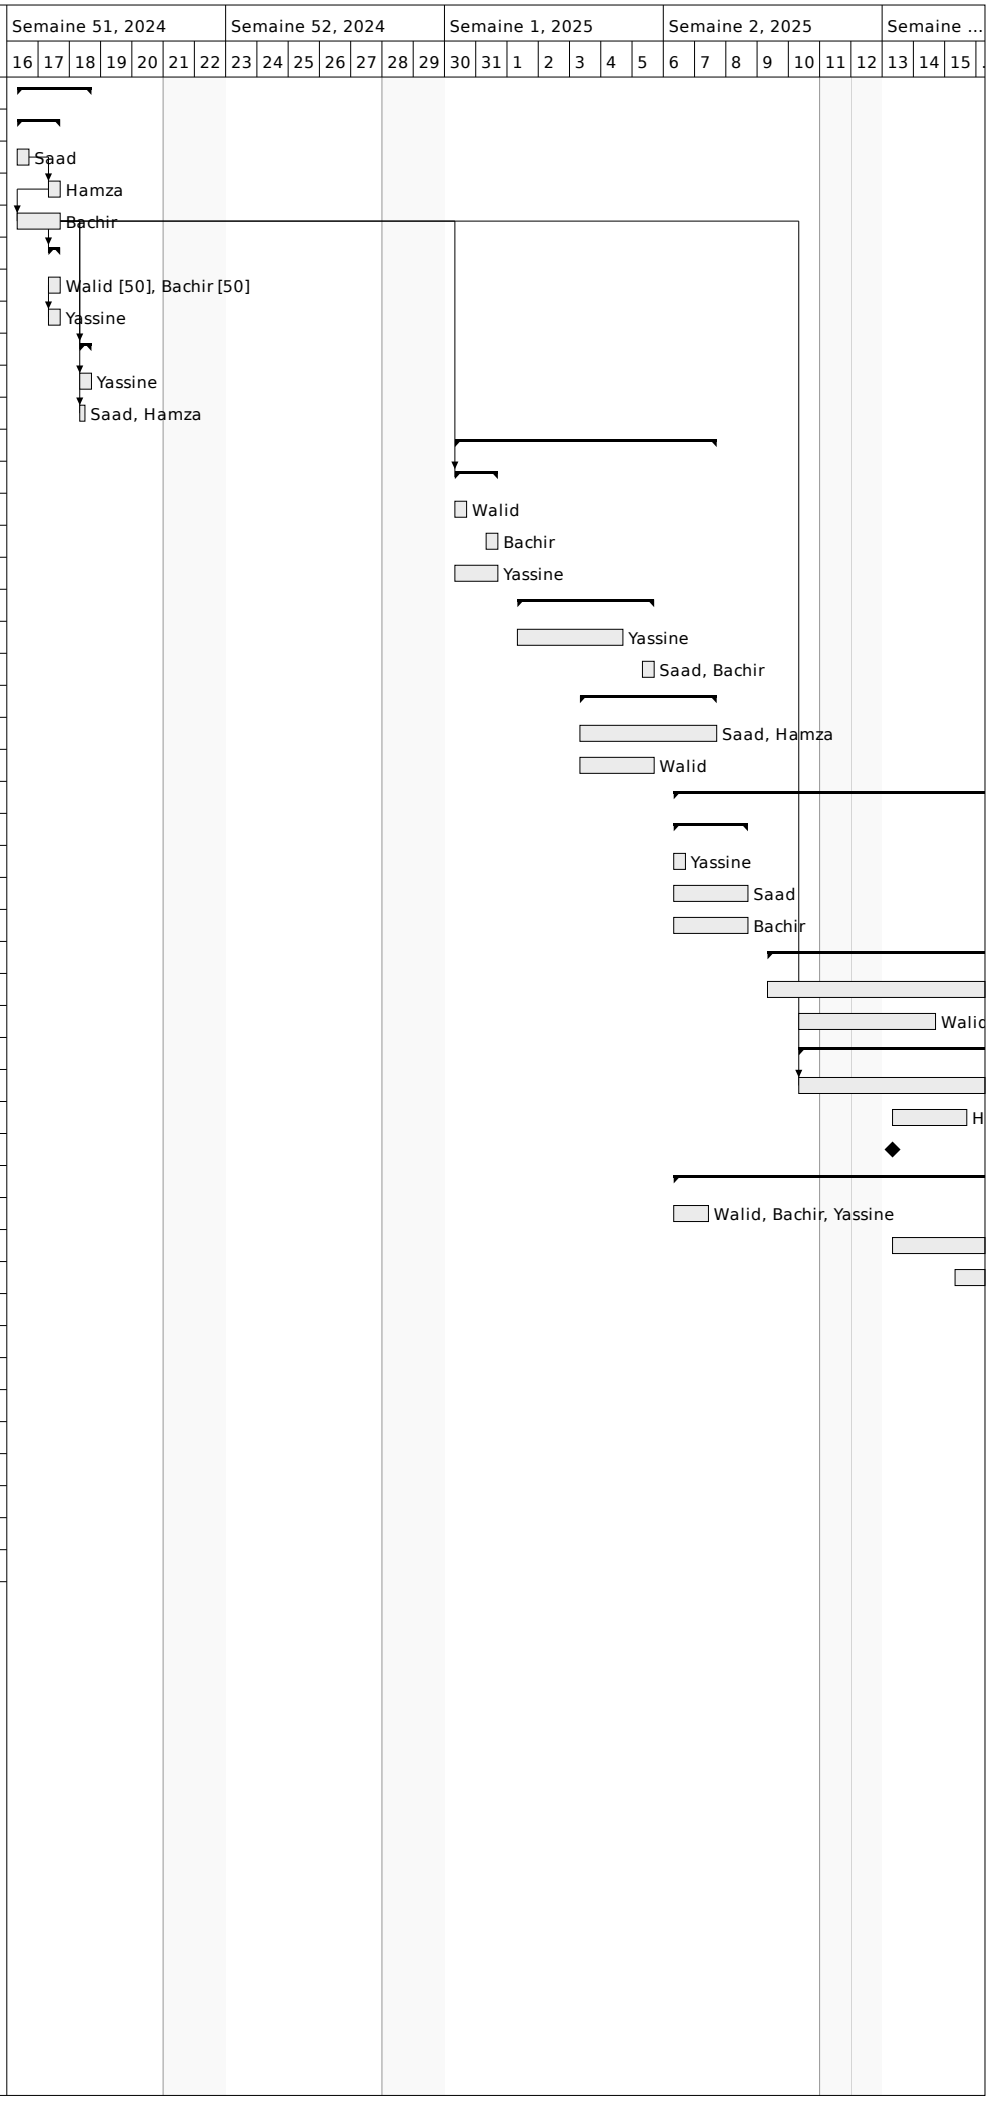

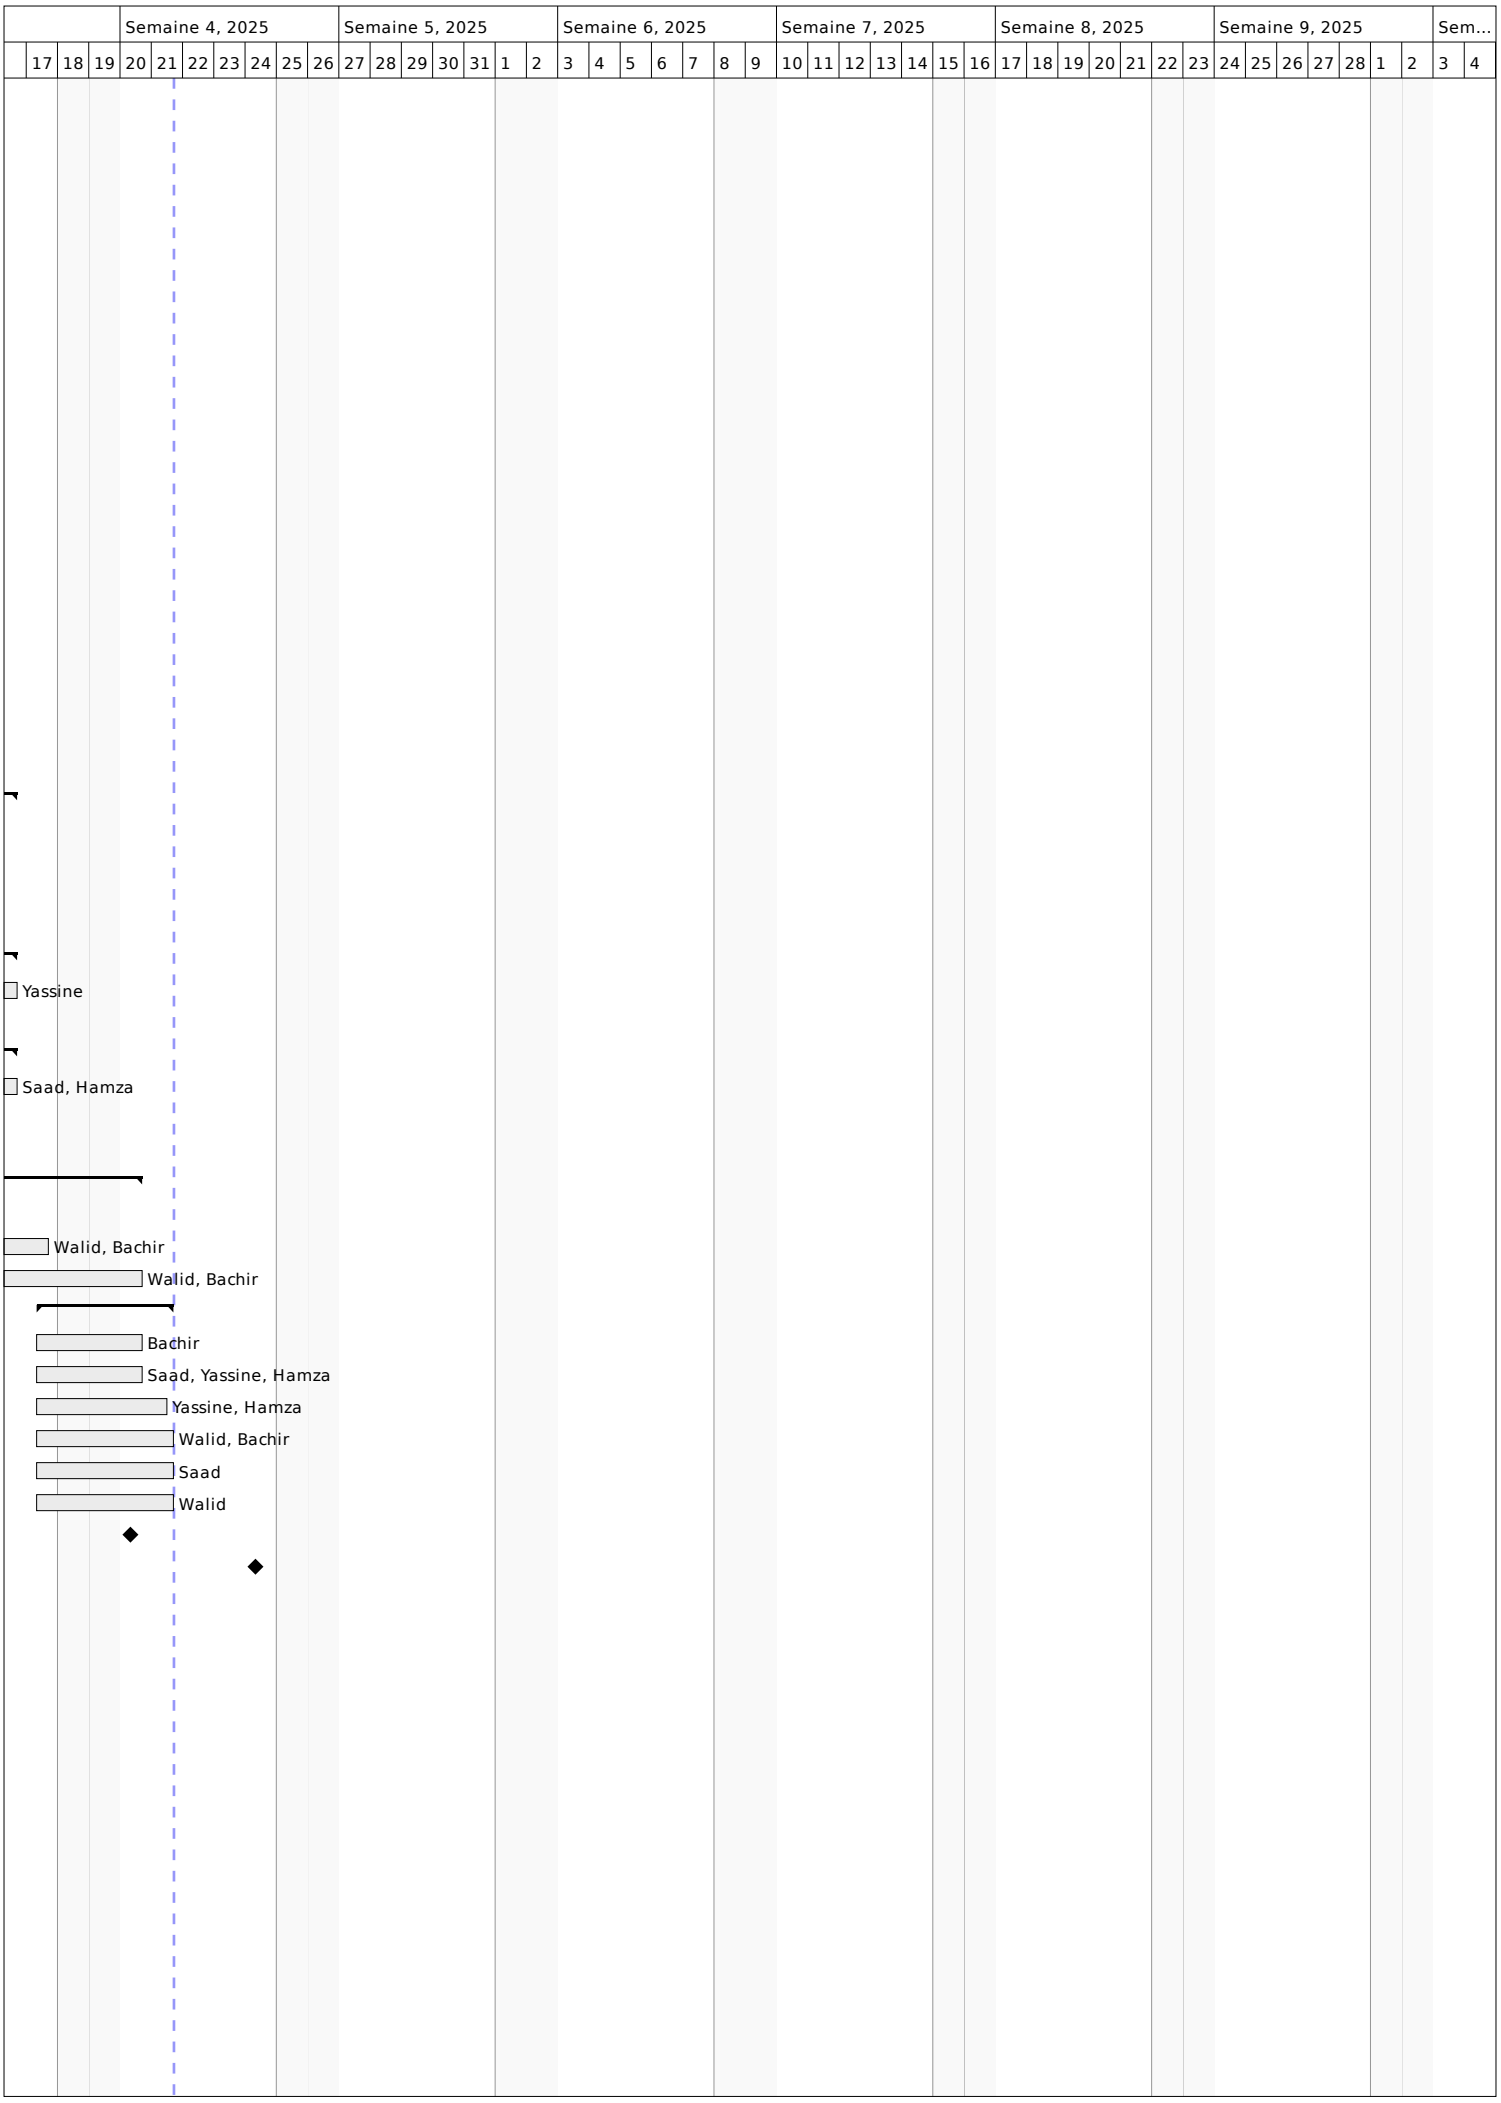
Semaine 4, 2025
Semaine 5, 2025
Semaine 6, 2025
Semaine 7, 2025
Semaine 8, 2025
Semaine 9, 2025
Sem...
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4
Yassine
Saad, Hamza
Walid, Bachir
Walid, Bachir
Bachir
Saad, Yassine, Hamza
Yassine, Hamza
Walid, Bachir
Saad
Walid

TPÉ	Nom	Démarré	Terminé	Travail	Durée	Latitude	Coût	Assigné à	État d'avancement (%)
1	**Compilateur Hello World**	**déc. 16**	**déc. 18**	**8j**	**3j**	**28j**	**0**		0
1.1	**Etape A: Analyse lexicale et syntaxique**	**déc. 16**	**déc. 17**	**4j**	**2j**	**29j**	**0**		0
1.1.1	Lexeur	déc. 16	déc. 16	1j	1j	23j	0	Saad	0
1.1.2	Parseur	déc. 17	déc. 17	1j	1j	22j 5h	0	Hamza	0
1.1.3	Tests unitaires associés	déc. 16	déc. 17	2j	2j	24j	0	Bachir	0
1.2	**Etape B: Analyse contextuelle**	**déc. 17**	**déc. 17**	**2j**	**1j**	**29j**	**0**		0
1.2.1	Implémentation des règles contextuelles	déc. 17	déc. 17	1j	1j	28j	0	Walid, Bachir	0
1.2.2	Tests unitaires associés	déc. 17	déc. 17	1j	1j	29j	0	Yassine	0
1.3	**Etape C: Génération du code**	**déc. 18**	**déc. 18**	**2j**	**1j**	**28j**	**0**		0
1.3.1	Génération du code	déc. 18	déc. 18	1j	1j	27j 4h	0	Yassine	0
1.3.2	Tests unitaires associés	déc. 18	déc. 18	1j	4h	28j 4h	0	Saad, Hamza	0
2	**Compilateur sans objet**	**déc. 30**	**janv. 7**	**23j**	**9j**	**12j**	**0**		0
2.1	**Etape A**	**déc. 30**	**déc. 31**	**4j**	**2j**	**19j**	**0**		0
2.1.1	Complétion du lexeur	déc. 30	déc. 30	1j	1j	20j	0	Walid	0
2.1.2	Complétion du parser	déc. 31	déc. 31	1j	1j	19j	0	Bachir	0
2.1.3	Tests unitaires associés	déc. 30	déc. 31	2j	2j	19j	0	Yassine	0
2.2	**Etape B**	**janv. 1**	**janv. 5**	**6j**	**5j**	**14j**	**0**		0
2.2.1	Complétions des règles contextuelles	janv. 1	janv. 4	4j	4j	15j	0	Yassine	0
2.2.2	Tests unitaires associés	janv. 5	janv. 5	2j	1j	14j	0	Saad, Bachir	0
2.3	**Etape C**	**janv. 3**	**janv. 7**	**13j**	**5j**	**12j**	**0**		0
2.3.1	Génération du code	janv. 3	janv. 7	10j	5j	12j	0	Saad, Hamza	0
2.3.2	Tests unitaires associés	janv. 3	janv. 5	3j	3j	14j	0	Walid	0
3	**Compilateur essentiel**	**janv. 6**	**janv. 16**	**29j**	**9j**	**5j**	**0**		0
3.1	**Etape A**	**janv. 6**	**janv. 8**	**7j**	**3j**	**11j**	**0**		0
3.1.1	Complétion du lexeur	janv. 6	janv. 6	1j	1j	13j	0	Yassine	0
3.1.2	Complétion du parser	janv. 6	janv. 8	3j	3j	11j	0	Saad	0
3.1.3	Tests unitaires associés	janv. 6	janv. 8	3j	3j	11j	0	Bachir	0
3.2	**Etape B**	**janv. 9**	**janv. 16**	**9j**	**6j**	**5j**	**0**		0
3.2.1	Complétion des règles contextuelles	janv. 9	janv. 16	6j	6j	5j	0	Yassine	0
3.2.2	Tests unitaires associés	janv. 10	janv. 14	3j	3j	7j	0	Walid	0
3.3	**Etape C**	**janv. 10**	**janv. 16**	**13j**	**5j**	**5j**	**0**		0
3.3.1	Génération du code	janv. 10	janv. 16	10j	5j	5j	0	Saad, Hamza	0
3.3.2	Tests unitaires associés	janv. 13	janv. 15	3j	3j	6j	0	Hamza	0
4	Rendu version intermédiaire	janv. 13	janv. 13	N/D	N/D	9j	0		0
5	**Extension**	**janv. 6**	**janv. 20**	**22j**	**11j**	**3j**	**0**		0
5.1	Specs	janv. 6	janv. 7	4j	1j 2h	12j 5h	0	Walid, Bachir, Yassine	0
5.2	Code	janv. 13	janv. 17	10j	5j	4j	0	Walid, Bachir	0
5.3	Documentation	janv. 15	janv. 20	8j	4j	3j	0	Walid, Bachir	0
6	**Documentation**	**janv. 17**	**janv. 21**	**25j**	**3j**	**2j**	**0**		0
6.1	Manuel utilisateur	janv. 17	janv. 20	2j	2j	3j	0	Bachir	0
6.2	Conception	janv. 17	janv. 20	6j	2j	3j	0	Saad, Yassine, Hamza	0
6.3	Validation	janv. 17	janv. 21	5j	2j 4h	2j 4h	0	Yassine, Hamza	0
6.4	Extension	janv. 17	janv. 21	6j	3j	2j	0	Walid, Bachir	0
6.5	Impact énergétique	janv. 17	janv. 21	3j	3j	2j	0	Saad	0
6.6	Bilan gestion de projet	janv. 17	janv. 21	3j	3j	2j	0	Walid	0
7	Rendu Final	janv. 20	janv. 20	N/D	N/D	4j	0		0
8	Soutenance	janv. 24	janv. 24	N/D	N/D		0		0

Nom	Nom abrégé	Type	Groupe	Adresse électronique	Coût
BARKATOU Walid	Walid	Travail			0
BELALLAM Saad	Saad	Travail			0
BELQASMI Bachir	Bachir	Travail			0
OUAGGAS Yassine	Yassine	Travail			0
SANTOURA Hamza	Hamza	Travail			0
